

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

городской округ Жуковский

Приобретение оборудования, работы по замене трубопроводов горячего и холодного водоснабжения для дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов, Адрес: Московская область, г. Жуковский, ул. Макаревского, д. 3А

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2 900 800,00	2 268 430,00	603 362,00	29 008,00	2 523 935,78	1 973 721,61	524 974,81	25 239,36	2 523 935,78	1 973 721,61	524 974,81	25 239,36	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 13.11.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 11.12.2023 г.
5. К отчету прилагаются на двух листах: *фотографии объекта по итогам реализации проекта.*

Инициатор (представитель инициативной группы):

И.В. Чистюхин



(подпись)

Глава городского округа Жуковский


Б.Е. Аубакиров



(подпись)



Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

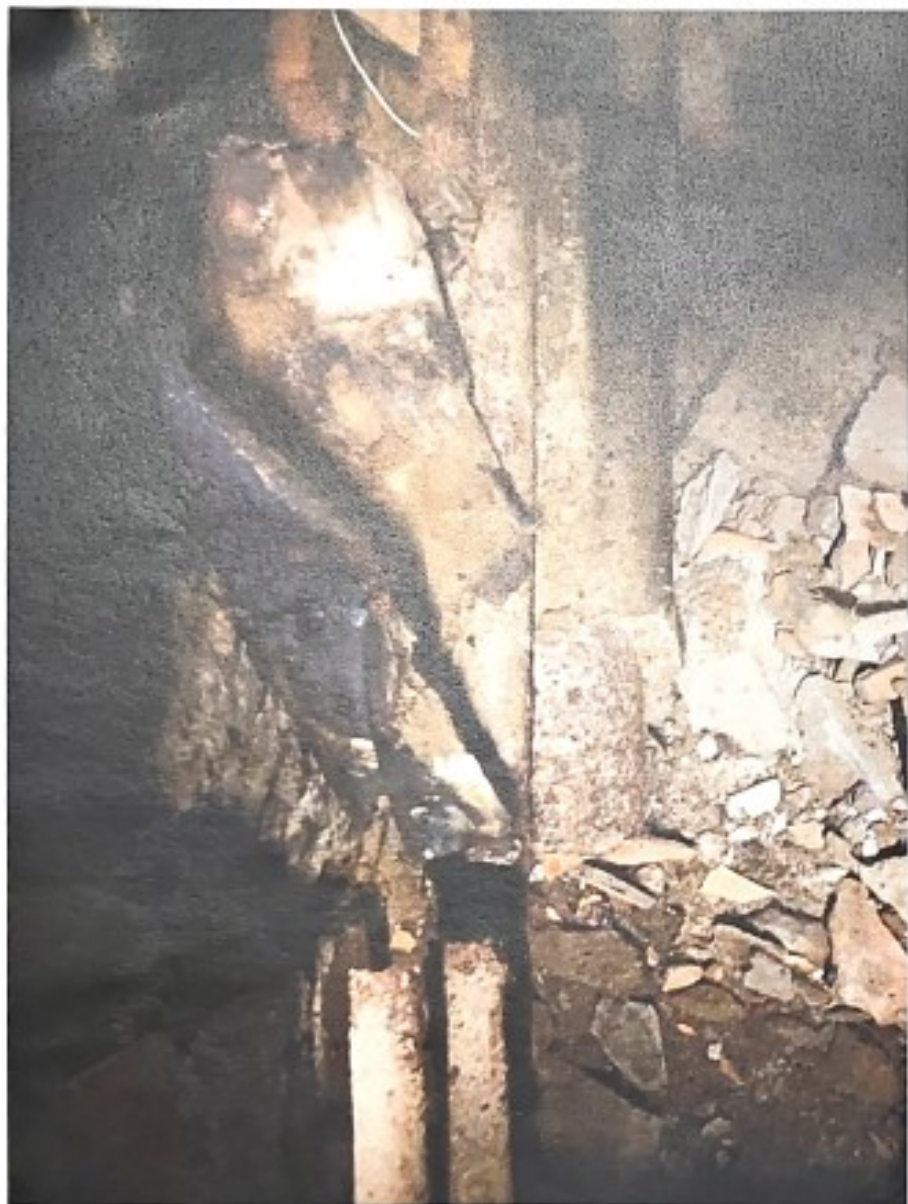

Было



Стало



Было



Стало
